


期の途中の分かれ道で、迷わず決める

期中の見直し チェックリスト

KPIが届かない・KPIの設計がずれた・予算を削られる、3つの場面の判断

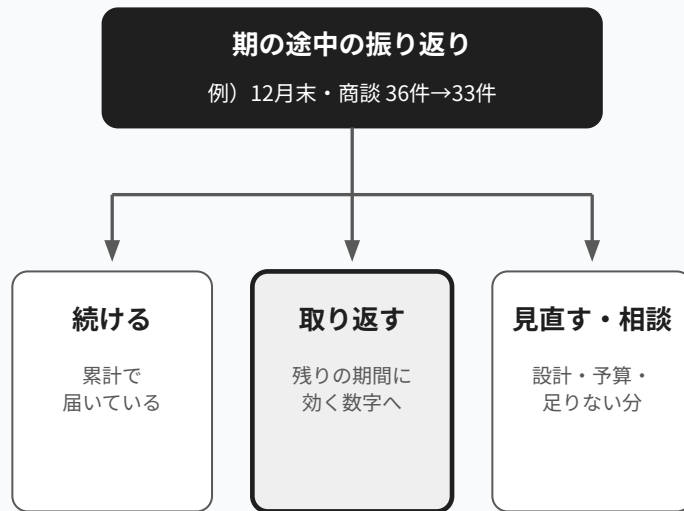

場面ごとに、確かめる順番がある

期の途中で、何を続け、何を変えるかを30分で決める

四半期の振り返りや、急な予算の見直しの際に開くチェックリストです。毎月の予実管理表の数字を写し、上から順に答えます。

Before

~~届かないとわかって打ち手を足す~~

~~KPIを変えるか決められない~~

~~削減は全施策を一律に減らす~~



After

- 1 取り返せる差かを件数で出し、手を打つ数字を1つに決める
- 2 打ち手の問題か、KPIの設計の問題かを分けられる
- 3 削る施策と、今期の受注への影響を一文で示せる

この資料で手に入るもの

KPI

未達のときのチェックシート

KPI

設計の見直しチェックシート

予算

削減の判断表

共通

経営陣への一文・実行プラン

所要時間：数字がそろっていれば、1つの場面で30分ほど

目次

01 場面を見分けて、数字をそろえる

02 KPIを見直す

03 予算を見直す

04 決めて、伝える

01

場面を見分けて、数字をそろえる

3つの場面と使う時期／見直しの前に写す数字

期の途中の見直しは、3つの場面で使い分ける

どの場面かで、確かめることと決めることが変わります。当てはまる場面のページだけを使います。

場面1

p.8～10

KPIが届かない

使うとき

四半期の振り返り。累計の達成率が判定の線を下回った

決めること

4つの問いで、手を打つ数字を1つ決める

場面2

p.11～12

KPIの設計がずれている

使うとき

毎月のように届かない／KPIは届いているのに受注が届かない

決めること

KGIからKPIまでのつながりを確認、直す

場面3

p.14～15

予算の削減を求められた

使うとき

下期や期末の前に、経営陣から費用を減らすよう求められた

決めること

削る施策の順番と、今期の受注への影響

使う時期の目安：場面1は四半期の終わりの月（6・9・12月）。場面2は場面1で同じ答えが2回続いたとき。場面3は求められたその週に。

数字は予実管理表から写し、集め直さない

見直しに使う数字は、毎月の予実管理表（KPI達成率×ROI）にそろっています。最新の月を選んで、次の5つを写します。

写す数字	写し元（予実管理表）	記入例（12月末）	使う場面
KPIの累計の計画と実績	2_月次報告 ①	商談 36件 → 33件（92%）	1・2
残りの月の計画	1_入力 ②（月別の計画）	1～3月の商談 6件（2・2・2件）	1
KPIの手前の数字	2_月次報告 ④（ボトルネック）	MQLのうち期限内に連絡 累計84%	1・2
施策ごとの判定	3_施策の評価 ②（止める基準）	展示会 商談10件／基準12件	1・3
予算の消化と残り	4_経営報告（予算の消化率）	775万円使用・残り1～3月 135万円	3

判定は累計で：1か月だけの達成率では判定しません。期首からの累計を、月別の計画の累計と比べます（判定の線は期初に決めたもの。例：100%以上＝達成、90～99%＝やや届かない、90%未満＝届かない）。

[予実管理表をダウンロード→](#)

予実管理表を使っていない場合は、自社の表から同じ数字を写します。

02

KPIを見直す

場面1 KPIが届かない：4つの問い・チェックシート／場面2 KPIの設計がずれている：サイン・チェックシート

問い1と2：本当に足りないか、取り返せる差か

打ち手を考える前に、足りない件数と残りの時間を押さえます。達成率だけを見ると、取り返す難しさを見誤ります。

1 本当に足りないのか

年間の目標を月数で割った線ではなく、月別の計画の累計と比べます。展示会のあとに商談が集まる計画なら、割った線では計画どおりでも未達に見えます。

12月末の線	商談
年間42件 ÷ 12か月 × 9か月	31.5件
月別の計画の累計（4～12月）	36件
実績の累計	33件（92%）

2 残りの期間で取り返せる差か

年間の目標までに今期中にあと何件要るかを出し、残りの月の計画と比べます。

見るもの	計算	件数
今期中に要る件数	42 - 33	9件
残りの月（1～3月）の計画	42 - 36	6件
計画を上回る分	9 - 6	3件

達成率92%でも、残り3か月で計画の1.5倍が要る

分かれ目：問い1で累計が届いていれば、今の打ち手を続ける。問い2で、手元のリード（連絡が遅れたMQLなど）が上回る分より多ければ取り返す、足りなければ早めに相談する。

問い3と4：今期に間に合う数字に手を打ち、足りない分は相談する

打ち手には効くまでの時間があります。期の後半ほど、KPIのすぐ手前の数字しか間に合いません。

3 どの数字に手を打つか（KPI＝商談の場合）

打ち手	商談に効くまで	期の後半に打って今期に間に合うか
営業への受け渡しと連絡を直す	早い。渡したMQLがその月から商談になる	間に合う
手元のMQLや過去のリードに声をかける	早い。すでにあるリードを使う	間に合う
リードを増やす（広告・ウェビナーなど）	商談になるのは翌月から翌々月	期末の2か月ほど前まで
率を上げる（MQLの条件・提案の中身）	仕組みを変えるので時間がかかる	来期に効く手として決める

届いていない数字が複数あるときは、KPIに近いほうを選ぶ。打ち手はメイン1つと控え1つ。

4 取り返せない分をどうするか：わかった時点で、4つを1枚にして相談する

今の状況

累計と月別の計画の累計

取り返す打ち手

自分たちで埋まる件数

協力してほしいこと

埋まらない件数と、他部署に頼むこと

来期に効く打ち手

今期の未達とは分けて示す

場面1 KPIが届かないときのチェックシート

確かめること	書くこと（記入例：12月末）
☐ 1. 月別の計画の累計と比べた	累計の計画 36件 → 実績 33件（92%）。判定：やや届かない
☐ 1. 数え方がマーケと営業でそろっている	商談は「商談管理表に載った月」で数える（営業と確認済み）
☐ 2. 今期中に要る件数と残りの計画を出した	要る 9件／残りの計画 6件／上回る分 3件（計画の1.5倍）
☐ 2. 上回る分を埋める手元のリードがある	期限を過ぎて連絡した展示会のMQL 12件。上回る分（3件）より多い
☐ 3. KPIに近く、今期に間に合う数字を選んだ	MQLのうち期限内に連絡（累計84%・12月70%）
☐ 3. メインと控えの打ち手を1つずつ決めた	メイン：連絡が遅れたMQL 12件に連絡し直す／控え：過去のリードに声かけ
☐ 4. 埋まらない分と、頼むことを書いた	1月の結果で判断。埋まらなければ、過去のリードへの声かけを営業に依頼
☐ 4. 来期に効く打ち手を分けて書いた	MQLの条件の見直し・リードを増やす広告は、来期の計画に入れる

判定 ☐ 今の打ち手を続ける ☐ 打ち手で取り返す ☐ 取り返せない分を相談する

※ 記入例は、従業員100名の部品メーカー（4月始まり・マーケを始めて3年目）の12月末を想定した架空の数字です。

打ち手ではなく設計の問題か、4つのサインで見分ける

KGIからKPIへ、成功の決め手（CSF）を通らずにつないでいると、打ち手を変えても受注に効きません。

サイン	起きていること	直し方
月別の計画の累計で見ても、毎月届かない	目標に使った率や、リードを集める計画がずれている	目標の率を直近の実績で出し直す
KPIは届いているのに、受注が届かない	KPIが受注につながる数字になっていない	KGIから、ボトルネック（CSF）を通してKPIを選び直す
マーケと営業の動きがばらばら	マーケが選別していないリードを集め、営業との受け渡しが切れている	受け渡しの条件（MQL）と連絡の期限を営業と決める
個人の目標が、KPIと関係ない作業の本数	例）「記事を〇本公開」が目標になり、KGIと切れている	作業は作業表に回し、効く数字を1つ書く

KGIからKPIへのつなぎ方



場面2 KPIの設計を見直すチェックシート

確かめること	書くこと（記入例）
☐ KGIを、受注に近い数字で言える	マーケ経由の受注 12件・3,000万円
☐ 受注の手前で、いちばん詰まっている所（CSF）を1つ言える	受注の見込みが高いリードを、すぐ営業に渡せていない
☐ KPIは1つで、CSFが進むと増える数字になっている	マーケ経由の商談。MQLを2営業日以内に営業が連絡すると増える
☐ KPIが届けば、受注も届く計算になっている	商談42件 × 受注率29% = 受注12件
☐ 商談とMQLの数え方・受け渡しの条件を、営業と決めている	MQL=資料DL+役職・業種の条件に合う会社。連絡は2営業日以内
☐ ツリーの数字を、そのまま個人の目標にしていない	作業表に「効く数字」の列を足し、本数の目標は置かない

直したら：経営陣と営業の責任者に合意を取り、翌月の判定から新しいKPIを使う。それまでの実績は、前のKPIのまま並べて残す。

判定

☐

設計はこのまま（場面1へ）

☐

KPIを選び直す

☐

目標の率を出し直す

03

予算を見直す

場面3 予算の削減を求められた：削る順番／削減の判断表

一律に減らさず、削る順番を決めてから額を当てる

全施策を同じ割合で減らすと、受注を支えている施策まで弱くなります。施策を「防衛」と「攻撃」に分け、次の順で削ります。

1

止める基準に届かない攻撃の施策

期初に決めた基準（例：12月までにリード10件・商談1件）に届いていないもの

2

成果は出ているが、今期の受注に効かない攻撃の費用

残りの期間に使っても、商談になるのが来期になる費用。「止める」ではなく「来期へ移す」として扱う

3

防衛の施策のうち、受注1件あたりの費用が高いもの

今の受注を支える施策。削るのは最後で、受注1件あたりの費用が高い順に

削らない費用

ツール・サイトの保守

年額の契約で、止めても戻りにくい固定費

今期のKPIのすぐ手前に効く費用

受け渡し・連絡など、今期の商談に間に合うもの

額を決めたら、影響を一文で：削った費用で、今期と来期のリード・商談・受注が何件変わるかを示す。今期の見込みが変わらない削り方なら、そのことを先に伝える。

防衛＝今の受注を支える施策（展示会・実績のある広告など）／攻撃＝新しい顧客や手法を試す施策。

場面3 削減の判断表 記入例：1～3月の135万円から30万円を削る

施策	区分	1～3月の額	止める基準	今期の商談に効くか	削る順	削る額
ウェビナー（3月）	攻撃	15	クリア	効かない（商談は4月以降）	2	15（4月へ移す）
記事・事例・ホワイトペーパー	攻撃	30	クリア	ほぼ効かない（公開から商談まで数か月）	2	15（外注を半分に）
リスティング広告	防衛	60	期末に判定	1月のリードまで効く	3	0
MAツール	防衛	21	—	固定費	削らない	0
自社サイトの保守	防衛	9	—	固定費	削らない	0
合計		135				30

単位：万円。展示会（10月）と新しい業種向けの試行（7～12月）は、1～3月の費用がないので表に入れていません。

今期への影響

例）今期の商談・受注の見込みは変わらない（削る費用は、どちらも商談になるのが来期のため）

来期への影響

例）来期の4～6月のリードが減る。ウェビナーは4月に開き、記事は来期の計画で本数を戻す

止める基準に届かない攻撃（順番1）はこの例ではなし。成果が出ている攻撃を削るときは、来期に戻す前提で「移す」と伝えます。

04

決めて、伝える

経営陣に伝える一文／仕上がりチェック／実行プラン

場面ごとに、状況・打ち手・お願いを一文ずつ

数字の読み上げで終わらず、決めたことと、経営陣に決めてほしいことを分けて伝えます（記入例は架空の数字）。

場面1

「12月末の商談の累計は、計画**36件**に対して**33件**です。年間の42件まで1〜3月にあと**9件**要り、計画の6件より3件多く必要です。1月は、連絡が遅れたMQL 12件への連絡し直しで取り返します。埋まらない場合は、過去のリードへの声かけに営業の協力をお願いします。」

場面2

「KPIの商談は届いていますが、受注が届いていません。営業への受け渡しで止まっているため、**MQLの条件と連絡の期限**を営業と決め直し、来月の判定から使います。それまでの実績は前の数字のまま並べます。」

場面3

「1〜3月の**30万円**の削減は、3月のウェビナーを4月へ移し、記事の外注を半分にして出します。どちらも商談になるのは来期のため、**今期の受注の見込みは変わりません**。来期の計画で戻します。」

見直しを伝える前の仕上がりチェック

使った場面の項目に、すべてチェックが入れば合格です。入らなかった項目は、該当するページに戻って直します。

共通

☐

数字は予実管理表から写し、累計で判定した

共通

☐

決めたことを、経営陣に伝える一文にした

場面1

☐

今期中に要る件数と、残りの計画を比べた

場面1

☐

打ち手はメイン1つと控え1つで、今期に間に合う

場面2

☐

KGI→CSF→KPIを一文でつなげて言える

場面2

☐

新しいKPIを使い始める月を、営業と合意した

場面3

☐

削る順番どおりに額を当て、一律に減らしていない

場面3

☐

今期と来期への影響を、件数で書いた

合格ライン：「共通」と、使った場面の項目にすべてチェック → 経営会議・営業との会議に出す

4日で見直しを決め、経営陣と営業に伝える

四半期の終わりの月に、月次の締めのもと始めます。予算の削減を求められたときは、DAY1とDAY3だけを先に進めます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
写す 30分 予実管理表で最新の月を選び、5つの数字をこの資料に写す 月 日	KPI 30分 場面1の4つの問いに答える。同じ答えが2回目なら、場面2も確かめる 月 日	予算 30分 施策を防衛と攻撃に分け、削る順番どおりに判断表を埋める 月 日	伝える 30分 一文にまとめ、仕上がりチェックのあと経営陣と営業の責任者に伝える 月 日

今日やること：予実管理表を開き、KPIの累計と残りの月の計画を写す（15分）

さいごに

期の途中で数字が届かないと、打ち手を足したくなります。けれども、残りの期間に効く手は限られています。足りない件数と残りの時間を先に押さえ、手を打つ数字を1つに絞りましょう。

予算の削減も同じで、削る順番を先に決めておけば、今期の受注を守りながら答えられます。

見直しの数字は、予実管理表から

施策ごとの実績を毎月1か所に入れるだけで、KPIの累計・施策の判定・予算の消化がそろいます。この資料の記入例と同じ数字が入っています。

予実管理表をダウンロード→

mktg.ax/download/kpi-management-template
