MKTG.AX

KPIと予算の予実を、毎月1か所で

予実管理表（KPI達成率×ROI）

使い方ガイド｜実績を入れるだけで、月次報告・施策の評価・経営報告ができる

シートをコピーして使う →

Googleスプレッドシート｜使い方はこのガイドの6ページ目から

受注の着地見込み	回収期間（累計）
2,780万円	21.1か月
やや届かない	達成

予算の消化率	KPI（商談）
100%	92%
達成	やや届かない

手を打つ施策　業界展示会　商談 10件／基準12件

実績を1か所に入れるだけで、報告まで仕上がる

計画を立てても、毎月の集計と報告づくりに追われると、手を打つ場所を決める時間が残りません。施策ごとの実績を入れるだけで、KPI・予算・人件費込みの費用対効果と、経営への報告がそろう管理表です。

Before

- ~~KPIと予算を別の表で管理している~~
- ~~人件費を入れずにROIを報告している~~
- 着地見込みを、計画の残りで出している

→

After

1. **KPI達成率・予算消化率・回収期間が1枚に並ぶ**
2. **着地見込みを、進行中の商談から出せる**
3. **経営報告が1画面（A4横1枚）でできる**

手に入るもの

シート	入力・月次報告
シート	施策の評価・経営報告
シート	使い方（記入例つき）
ガイド	この使い方ガイド

所要時間：期のはじめの準備は15分、毎月の入力は15分ほど

決めて、分けて、計画した数字を、毎月の予実で回す

この管理表は、KPIと予算を扱う4つの段階の最後です。前の段階で立てた年間計画を貼り、毎月の実績とくらべて、報告までつなげます。

1

KPIを決める

受注目標から、毎月追う数字を1つ決める

›

2

KPIツリーに分ける

KPIを動かす数字（リード・MQLなど）に分ける

›

3

年間計画を立てる

今期の実績から逆算し、施策・人件費込みの予算・止める基準を決める

›

4

予実を管理し、報告する

毎月の実績をくらべ、手を打つ施策を決めて報告する

この管理表

つなぎ方：年間計画シート（KPIと予算）の「6_予実管理表へ」を、この管理表の「1_入力」に値で貼るだけ。年間計画シートを使っていなくても、自社の計画を直接入れれば使えます。

目次

01 シートを用意し、期のはじめに計画を貼る

02 毎月の5ステップ

03 期末に使い、来期につなげる

01

シートを用意し、期のはじめに計画を貼る

コピーのしかたとタブの役割／年間計画シートから貼るもの

コピーして、入力は「1_入力」だけ

配布しているシートは閲覧のみです。自分のGoogleドライブにコピーしてから使います。

コピーのしかた

1 リンクを開く

下記の「シートをコピーして使う」ボタンから開きます。Googleアカウントにログインしておきます。

シートをコピーして使う →

2 コピーを作成する

「コピーを作成」を押します。出ないときは「ファイル」→「コピーを作成」。

3 名前をつけて保存

「2027年度_予実管理表」のように、年度がわかる名前にします。

タブの役割

入れる	1_入力	計画を貼り、毎月の実績を入れる
見る	2_月次報告	責任者・メンバー向けの予実
見る	3_施策の評価	許容CPLと止める基準の判定（期末の判定だけ入力）
見る	4_経営報告	経営向けの1画面と年間報告

マスの色

水色＝入力　灰色＋太枠＝最も見る　黄色＝あわせて見る


判定の色：薄い緑＝達成・クリア・上限内、薄い灰色＝やや届かない、薄い赤＝届かない・上限超え

年間計画シートの表を、「1_入力」に値で貼る

年間計画シート（KPIと予算）の「6_予実管理表へ」に、この管理表と同じ並びの表ができています。①②③をコピーして貼るだけです。



年間計画シート「6_予実管理表へ」（コピー元）

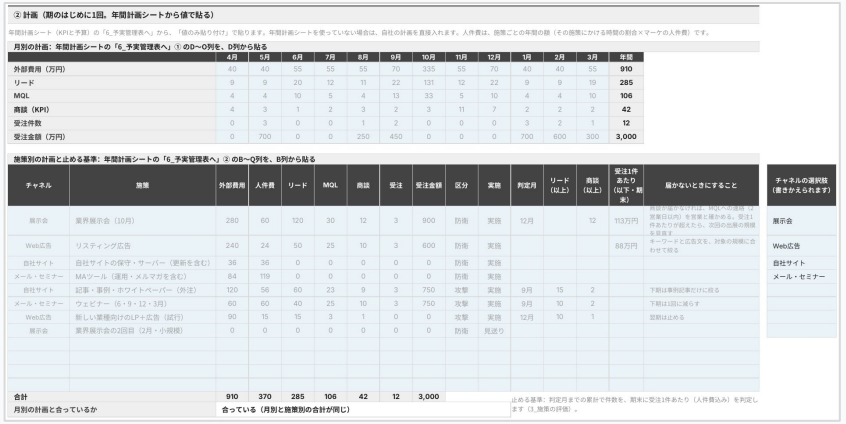

この管理表「1_入力」②（貼り先）

貼り方：①はD列から、②はB列から、③はD列を①の「受注になるまでの月数」の行から「値のみ貼り付け」。人件費と止める基準も一緒に入ります。「月別の計画と合っているか」が緑なら完了です。

02

毎月の5ステップ

STEP1 入れる／STEP2 見る／STEP3 探す／STEP4 判定する／STEP5 報告する

月の締めに、施策ごとの実績を1行ずつ入れる

「1_入力」③に、月と施策をプルダウンで選び、外部費用・リード・MQL・期限内に連絡したMQL・商談・受注・受注金額・失注金額・月末の進行中の商談金額を入れます。

③ 施策データ（毎月の締めに、施策ごとに1行。月と施策はプルダウン）

リードとMQLは獲得した月、商談は商談管理表に載った月、受注・失注は決まった月、外部費用は請求の月で数えます。商談・受注・失注は、営業の商談管理表の「きっかけ」がその施策のものだけ数えます。月末いない商談の金額のうち、期内に受注の見込みがあるもの（毎月の締めの時点の残高）です。

月	施策	外部費用	リード	MQL	MQLのうち期限内に連絡	商談	受注	受注金額	失注金額	月末の進行中の商談金額	チャネル（自動）	区分（自動）	月の順番（自動）
4月	業界展示会（10月）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	展示会	防衛	1
4月	リスティング広告	20	4	2	2	1	0	0	0	600	Web広告	防衛	1
4月	自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	3	0	0	0	0	0	0	0	0	自社サイト	防衛	1
4月	MAツール（運用・メルマガを含む）	7	0	0	0	0	0	0	0	0	メール・セミナー	防衛	1
4月	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	10	6	2	2	2	1	250	0	500	自社サイト	攻撃	1
4月	ウェビナー（6・9・12・3月）	0	0	0	0	1	0	0	0	500	メール・セミナー	攻撃	1
5月	業界展示会（10月）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	展示会	防衛	2
5月	リスティング広告	20	4	2	2	1	0	0	200	600	Web広告	防衛	2
5月	自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	3	0	0	0	0	0	0	0	0	自社サイト	防衛	2
5月	MAツール（運用・メルマガを含む）	7	0	0	0	0	0	0	0	0	メール・セミナー	防衛	2
5月	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	10	6	2	2	0	0	0	0	500	自社サイト	攻撃	2
5月	ウェビナー（6・9・12・3月）	0	1	1	1	1	1	250	0	500	メール・セミナー	攻撃	2
6月	業界展示会（10月）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	展示会	防衛	3
6月	リスティング広告	20	4	2	2	0	0	0	200	400	Web広告	防衛	3
6月	自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	3	0	0	0	0	0	0	0	0	自社サイト	防衛	3
6月	MAツール（運用・メルマガを含む）	7	0	0	0	0	0	0	0	0	メール・セミナー	防衛	3
6月	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	10	6	3	3	1	0	0	0	750	自社サイト	攻撃	3
6月	ウェビナー（6・9・12・3月）	15	10	6	6	1	0	0	0	750	メール・セミナー	攻撃	3
7月	業界展示会（10月）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	展示会	防衛	4

1 数字の出どころ

外部費用は経理の請求、リード・MQLはMAや名刺の表、連絡・商談・受注・失注は営業の商談管理表から

2 進行中の商談金額は残高

その月の末に、まだ決着していない商談の金額（期内に受注の見込みがあるもの）。前の月から足し上げません

3 人件費は入れない

年間計画で施策ごとに決めた額を、12か月に均等に置きます。チャネル・区分・月の順番も自動

月を選び、KPI達成率・予算消化率・回収期間を見る

「2_月次報告」の上で月を選ぶと、期首からその月までの累計で、KPIとそれを動かす数字の達成率が出ます。判定は累計で付けます。

マーケティングの月次報告（12月）

月を選ぶ：12月　実績は3月まで入っています

まとめ（期首から選んだ月までの累計）

商談（KPI）の達成率	予算（外部費用）の消化率	回収期間（人件費込み）	受注金額の着地見込み
92%	100%	21.1か月	2,780万円／計画3,000万円

計画 21.1か月・ROI -47%

①KPIと、それを動かす数字の達成率（KPIに近い順。判定は累計）

数字	当月の計画	当月の実績	当月の達成率	累計の達成率	累計の計画	累計の実績	判定（累計）	年間の計画	メモ（自動）
商談（KPI）	7	5	71%	92%	36	33	やや届かない	42	下の数字から、届いていない段階を探す（④）
受注金額（万円）	0	200		100%	1,400	1,400	達成	3,000	受注は商談の約3か月後に出るので、月ごとにばらつく。累計で見る
受注件数	0	1		100%	6	6	達成	12	
MQLのうち期限内に連絡	100%	70%	70%	84%	100%	84%	届かない	100%	当月に期限を過ぎたMQLが3件。営業と確かめる
MQL	10	10	100%	107%	88	94	達成	106	
リード	22	22	100%	108%	248	269	達成	285	

達成率＝実績÷計画。判定は累計の達成率で付けます（受注や商談は月に数件なので、1か月で振り回されないため）。当月の達成率は、届かない線（やや届かないの線）より下だと赤い文字になります。

1 いちばん見るのはKPI

商談（KPI）の累計の達成率。太枠のマスです

2 費用は人件費込みで

回収期間・ROIは外部費用と人件費の合計で出します。予算の消化率は外部費用で見ます

3 12月の例

商談は累計36件→33件（92%）で、やや届かない。予算の消化率は100%、回収期間は計画どおり

費用は3行で、着地見込みは進行中の商談から出す

②に、外部費用・人件費・費用合計と、人件費込みの回収期間・ROI・CAC・CPLが並びます。その下に、受注金額の着地見込みの内訳が出ます。

② 費用（外部費用・人件費）と、費用対効果（人件費込み）

費用（万円）	当月の予算	当月の実績	累計の予算	累計の実績	予算の消化率（累計）	年間の予算	年間に対する使用率	メモ（自動）
外部費用（外部に払う費用）	70	70	775	775	100%	910	85%	計画どおりに使っている
人件費（計画の額を月割り）	31	31	278	278	—	370	75%	人件費は、年間計画の施策ごとの額（時間の割合×人件費）を12か月に均等に置いています
費用合計（人件費込み）	101	101	1,053	1,053	—	1,280	82%	CPL・CAC・回収期間・ROIは、すべてこの費用合計で出します

費用対効果（期首から累計・人件費込み）	計画	実績	年間の計画	式と読み方
受注金額（万円）	1,400	1,400	3,000	マーケ経由の受注金額。受注は費用より約4か月遅れて出ます
回収期間（か月）	21.1	21.1	12.8	CAC÷1社あたりの月の粗利（平均単価×粗利率÷12）。経営への説明の主役。期の途中は受注が遅れて出るので長く出ます
ROI（1年）	-47%	-47%	-6%	（受注金額×粗利率−費用合計）÷費用合計。期の途中は低く出ます
CAC（受注1件あたりの費用）	175	175	107	費用合計÷受注件数（万円）。CACの上限は150万円
商談1件あたりの費用	29	32	30	費用合計÷商談（万円）。期の途中は、CACよりこちらで見ます
CPL（リード1件あたりの費用）	4.2	3.9	4.5	費用合計÷リード（万円）。許容CPL 6.3万円とくらべて：上限内

受注金額の着地見込み（万円）		選んだ月	年間の計画	式と読み方
受注済み（累計の実績）		1,400		期首から選んだ月までに受注した金額
月末の進行中の商談金額		4,600		1_入力③の、選んだ月の「月末の進行中の商談金額」（期内に受注の見込みがあるもの）の合計
受注率（決着した商談の金額）		30%		＝受注金額÷（受注金額＋失注金額）の期首からの累計。期首から3か月までは、前期の実績（29%）を使います
期内に受注できる新規分		0		まだ生まれていない商談から、期内に受注になる分。計画の受注金額のうち、選んだ月の3か月後より後の月の分
着地見込み	計画の93%	2,780	3,000	＝受注済み＋進行中の商談金額×受注率＋期内に受注できる新規分。期末の月は受注済みの金額そのものです

1 着地見込みの式

受注済み＋月末の進行中の商談金額×受注率＋期内に受注できる新規分

2 受注率は決着した商談で

受注金額÷（受注金額＋失注金額）。期首から3か月は前期の実績を使います

3 12月の例

1,400万円＋4,600万円×30%＋0＝2,780万円。計画3,000万円の93%で、やや届かない

ボトルネックから、翌月の打ち手を1つ決める

「2_月次報告」の④に、リードから商談までの段階のうち、累計の達成率がいちばん低い段階が赤で出ます。そこから翌月の打ち手を1つ決めます。

④ ボトルネック（リードから商談まで、累計の達成率がいちばん低い段階を赤で示す）

段階	計画	実績	達成率	達成率の太さ	見る所
リード	248	269	108%		チャネル別のリードは3_施策の評価の①で見る
MQL化率（MQL÷リード）	35%	35%	98%		MQLにならないリードへのフォローと、MQLの条件
MQL	88	94	107%		リードとMQL化率のどちらが届いていないか
MQLのうち期限内に連絡	100%	84%	84%		期限を過ぎたMQLへの連絡。連絡の期限を営業と見直す
商談化率（商談÷MQL）	41%	35%	86%		営業に渡すリードの条件を、営業と見直す
→ 商談（KPI）			92%	いちばん低い段階：MQLのうち期限内に連絡。ここから翌月の打ち手を1つ決めます	

翌月の打ち手の決め方と報告の書き方は、記事「マーケティングの月次報告」で解説しています：https://mktg.ax/blog/marketing-monthly-report

12月の例：リードとMQLは計画を上回っているのに、MQLのうち期限内に連絡した割合が84%で、いちばん低い段階。翌月は、期限を過ぎたMQLへの連絡と、連絡の期限を営業と見直すことに絞ります。

右の「見る所」に、その段階で確かめることが出ます。

止める基準に届かない施策を、名前で確かめる

「3_施策の評価」の上に、止める基準に届かない施策が、実績と基準の数字つきで出ます。①には施策ごとの人件費込みのCPLと、許容CPLとの判定が並びます。

予実管理表（KPI達成率×ROI）｜施策の評価

施策ごとに、費用（人件費込み）と、何件の商談・受注につながったかを同じ数字で比べ、許容CPLと、1_入力で決めた止める基準で自動で判定します。入力は②の「期末の判定」だけです。

まとめ

手を打つ施策（止める基準に届かない）
業界展示会（10月）　商談 10件／基準12件
リスティング広告　受注1件あたり 132万円／基準88万円

手を打つ施策は、②の「届かないときにすること」のとおりに動きます。施策どうしは、①の受注1件あたり（黄色）とCPLの判定で比べます。

全体（期首から・人件費込み）	
受注1件あたり	116万円　／計画 107万円
回収期間	14.0か月　／計画 12.8か月
ROI（1年）	-13%　／計画 -6%
実績のある月	3月まで

計画は年間の計画（1_入力の②の合計）。期の途中は受注が遅れて出るので、受注1件あたり・回収期間は長く、ROIは低く出ます。

1 件数の基準

リード・商談は、期首から判定月までの累計で判定します

2 受注1件あたりの基準

人件費込みで、期末（12か月目の実績が入ったあと）に判定します

3 許容CPLの判定

CPLが許容CPL以下なら上限内。記入例は新しい業種の試行が上限超え

経営報告にコメントを書き、経営会議に出す

「4_経営報告」は、2_月次報告で選んだ月の経営向けの1画面です。水色のコメントを2つ書くだけです。



マーケティングの経営報告（12月）

対象の月は「2_月次報告」で選んだ月です（このタブでは選びません）。数字はすべて1〜3のタブから自動で出ます。費用は人件費込み。入力は水色のコメント欄だけです。

毎月の経営報告（期首から選んだ月までの累計）

受注金額の着地見込み	回収期間（人件費込み・累計）	予算（外部費用）の消化率	KPI（商談）の達成率（累計）
2,780万円	21.1か月	100%	92%
計画 3,000万円（差 -220万円）	計画 21.1か月・ROI -47%（計画 -47%）	外部費用 775万円／予算 775万円（人件費込みの費用は1,053万円）	商談 33件／計画 36件
やや届かない	達成	達成	やや届かない

判定：着地見込みとKPIは計画に対する率（100%以上＝達成、90%以上＝やや届かない）。回収期間は計画÷実績（短いほどよい）。予算の消化率は計画との差（±5%以内＝達成、±10%以内＝やや届かない）。

今月の結論	受注の着地見込みは2,780万円で、計画3,000万円の93%（やや届かない）。商談（KPI）は累計92%で、10月の展示会のMQL（営業に渡した見込み客）への連絡が遅れている。1月に営業と連絡の期限を見直す。
経営にお願いしたいこと	営業の責任者に、展示会で集めたMQLへ2営業日以内に連絡するよう、ひとこと伝えてほしい。

受注金額の累計（万円）：計画と実績

手を打つ施策（止める基準に届かない）

業界展示会（10月）　商談 10件／基準12件

リスティング広告　受注1件あたり 132万円／基準88万円

3_施策の評価のまとめをそのまま引用しています（入力済みの最新の月の時点）。施策ごとの「届かないときにすること」は3_施策の評価の②にあります。

ことば：着地見込み＝受注済みの金額＋進行中の商談の金額×受注率（決着した商談で出す）＋期内に受注できる新規分。回収期間＝受注1件あたりの費用（人件費込み）を、1社の月の粗利で何か月で取り返

1 大きな数字は4つだけ

着地見込み・回収期間・予算の消化率・KPIの達成率。回収期間の下にROIを並べます

2 書くのは2行

「今月の結論」と「経営にお願いしたいこと」。細かい数字は2_月次報告に任せます

3 印刷はA4横1枚

上半分が毎月の報告。そのまま会議の資料になります


03

期末に使い、来期につなげる

年間報告と期末の判定／実行プラン

期末の判定を選び、来期の年間計画につなげる

12か月目の実績を入れると、「4_経営報告」の下半分に年間報告が出ます。「3_施策の評価」で施策ごとに期末の判定を選ぶと、ここに引用されます。

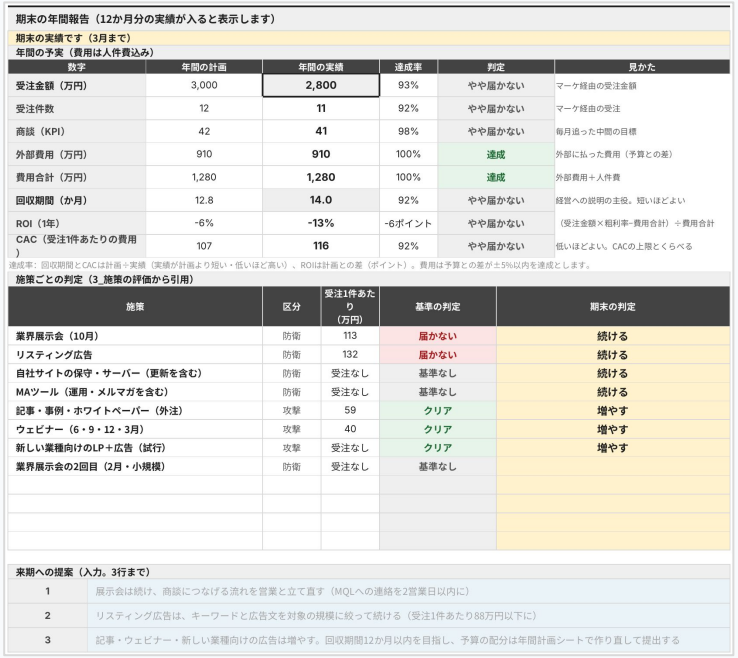

期末の年間報告（12か月分の実績が入ると表示します）

期末の実績です（3月まで）

年間の予実（費用は人件費込み）

数字	年間の計画	年間の実績	達成率	判定	見かた
受注金額（万円）	3,000	2,800	93%	やや届かない	マーケ経由の受注金額
受注件数	12	11	92%	やや届かない	マーケ経由の受注
商談（KPI）	42	41	98%	やや届かない	毎月追った中間の目標
外部費用（万円）	910	910	100%	達成	外部に払った費用（予算との差）
費用合計（万円）	1,280	1,280	100%	達成	外部費用＋人件費
回収期間（か月）	12.8	14.0	92%	やや届かない	経営への説明の主役。短いほどよい
ROI（1年）	-6%	-13%	-6ポイント	やや届かない	（受注金額×粗利率−費用合計）÷費用合計
CAC（受注1件あたりの費用）	107	116	92%	やや届かない	低いほどよい。CACの上限とくらべる

達成率：回収期間とCACは計画÷実績（実績が計画より短い・低いほど高い）、ROIは計画との差（ポイント）。費用は予算との差が±5%以内を達成とします。

施策ごとの判定（3_施策の評価から引用）

施策	区分	受注1件あたり（万円）	基準の判定	期末の判定
業界展示会（10月）	防衛	113	届かない	続ける
リスティング広告	防衛	132	届かない	続ける
自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	防衛	受注なし	基準なし	続ける
MAツール（運用・メルマガを含む）	防衛	受注なし	基準なし	続ける
記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	攻撃	59	クリア	増やす
ウェビナー（6・9・12・3月）	攻撃	40	クリア	増やす
新しい業種向けのLP＋広告（試行）	攻撃	受注なし	クリア	増やす
業界展示会の2回目（2月・小規模）	防衛	受注なし	基準なし	

来期への提案（入力。3行まで）

1	展示会は続け、商談につなげる流れを営業と立て直す（MQLへの連絡を2営業日以内に）
2	リスティング広告は、キーワードと広告文を対象の規模に絞って続ける（受注1件あたり88万円以下に）
3	記事・ウェビナー・新しい業種向けの広告は増やす。回収期間12か月以内を目指し、予算の配分は年間計画シートで作り直して提出する

1 年間の予実

受注金額・件数・商談、外部費用と費用合計、回収期間・ROI・CACを計画とくらべます。記入例は回収期間14.0か月、ROI −13%

2 期末の判定（入力）

施策ごとに、増やす・続ける・減らす・止めるを選びます（3_施策の評価の②）

3 来期への提案（入力）

3行で書き、判定に合わせて来期の年間計画シートを作り直します

期のはじめに貼り、毎月の締めから会議まで回す

毎月の流れを決めておくと、入力から経営報告まで30分ほどでそろいます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
期のはじめ｜15分	月の締め｜15分	会議の前｜15分	期末｜30分
シートをコピーし、年間計画シートの「6_予実管理表へ」を1_入力に貼る	施策ごとの実績と、失注金額・進行中の商談金額を1_入力③に入れる	2_月次報告と3_施策の評価で、手を打つ場所を決め、4_経営報告にコメントを書く	期末の判定と来期への提案を書き、来期の年間計画に反映する
☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日

今日やること：シートをコピーし、年間計画シートの「6_予実管理表へ」を「1_入力」に値で貼る（15分）

さいごに

数字は、集めることより、手を打つ場所を決めることに時間を使ってください。実績を1か所に入れておけば、毎月の予実も、施策の判定も、経営への報告も、同じ数字から作れます。

届かない月が続いたときは、ボトルネックの段階と、止める基準に届かない施策から見直します。

ご質問・ご意見をお聞かせください

管理表の使い方や、自社の数字への当てはめ方で迷ったときは、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームへ →

mktg.ax/contact
