MKTG.AX

目標を逆算し、施策と予算をひとつの計画にする

年間計画シート（KPIと予算）

使い方ガイド｜今期の実績から逆算し、人件費込みで施策と予算を決める

シートをコピーして使う →

Googleスプレッドシート｜コピーのしかたは5ページ



水色＝入れるシート　　数字は記入例（架空）

KPIシリーズ

1 KPI決定 › 2 KPIツリーに分解 › **3 年間計画** › 4 予実管理 › 5 月次・年間報告

目標・施策・予算を、人件費込みの1つの表でつなぐ

来期の売上目標と今期の実績から、マーケの目標を逆算するシートです。目標に届く施策を並べ、外部費用と人件費をつけ、予算の上限に収めると、年間と月別の計画ができあがります。

Before

目標を、前年の数字に何%か足して決める

~~人件費を入れずにROIを出している~~

~~削れと言われ、一律に減らす~~

→

After

1. **今期の実績から、受注・商談・リードの目標が逆算できる**
2. **施策ごとに、人件費込みのCPL・回収期間で判定できる**
3. **上限内でどの施策を残すかを数字で決められる**

手に入るもの

入れる	1_施策・2_予算・3_調整
見る	4_年間計画・5_月別計画
貼る	6_予実管理表へ
ガイド	この使い方ガイド（記入例つき）

所要時間：今期の実績と見積もりがそろっていれば、入力は1時間ほど

目次

01 シートを用意する

02 入れて決める3つのステップ

03 計画を見て、予実管理につなぐ

01

シートを用意する

コピーのしかたとマスの色／6枚のシートの流れ

コピーして、マスの色を覚える

配布しているシートは閲覧のみです。自分のGoogleドライブにコピーしてから使います。

コピーのしかた

1 リンクを開く

下記の「シートをコピーして使う」ボタンから開きます。Googleアカウントにログインしておきます。

シートをコピーして使う →

2 コピーを作成する

「コピーを作成」を押します。出ないときは「ファイル」→「コピーを作成」。

3 名前をつけて保存

「2027年度_年間計画」のように、年度がわかる名前にします。

Excelで使うときは「ファイル」→「ダウンロード」→「Microsoft Excel」で保存します。

マスの色

水色

入力・選択するマス。ほかは自動で計算されます



太い枠＋灰色

いちばん見る結果（商談＝KPI、予算の合計）

黄色

あわせて見る数字（回収期間・ROI・許容CPLなど）

緑・赤

判定。緑＝届く・上限内、赤＝足りない・上限超え

記入例（架空の製造業・100名・4月始まり・マーケを始めて3年目）の上から書きかえます。金額の単位は万円です。

入れるのは3枚だけ。あとは自動でできあがる

来期の売上目標と今期の実績を入口に、1→2→3の順に入れます。4〜6は入力なしで、3で決めた計画がまとまります。

入口

来期の売上目標
15億円×マーケ経由2%

今期の実績
リード285・商談42
受注12・失注30

人件費370万円

→

入れる 1_施策

目標を逆算し、施策を決める

目標（受注12件・商談42件・リード285件）と許容CPLが出る。施策を並べて届くかを見る

入れる 2_予算

いくら必要か（人件費込み）

外部費用・実施月・時間。人件費が時間の比で配られ、CPL・回収期間・判定が出る

入れる 3_調整

予算内で効果を最大に

外部費用を上限内に収め、止める基準を決める

→

見る 4_年間計画

人件費込みの判定・四半期・月別・チャネル別・施策別・シナリオ

見る 5_月別計画

月を選ぶと、その月と期首からの累計

貼る 6_予実管理表へ

期が始まったら、予実管理表に値で貼る

_計算（非表示）は計算用のシートです。触らずにそのまま使います。

02

入れて決める3つのステップ

STEP1 目標を逆算し、施策を決める／STEP2 人件費込みで予算を見積もる／STEP3 上限内で調整し、止める基準を決める

前提と今期の実績を入れ、目標を逆算する

「1_施策」の②に、売上目標・マーケ経由の割合・平均単価・今期の実績（リード・商談・受注・失注）を入れます。①に受注・商談・リードの目標が出ます。

② 前提と、今期の実績からの逆算

期のはじめに1回入れます。率は今期の実績を使います（期の途中なら、期末までの見込み）。下の4つ（自動）が、①の目標と、2_予算・3_調整の判定に使われます。

粗利率	40%	ROI・回収期間・CACの上限に使います。経理に確かめて入れます
期の最初の月	4月	月別計画の月の並びに使います（1〜12）
商談になる月：リードの翌月に入る割合	60%	残りは翌々月に入れます（記入例：翌月6割・翌々月4割）。営業の担当者に聞いて決めます
受注になるまでの月数（商談から）	3か月	記入例：商談の3か月後（リードから約4か月）
マーケの人件費（年額・万円）	370	マーケの担当者の時間に、施策に協力する営業の時間も含めた年額。2_予算で、施策の時間の比で配ります
取り返す年数	1.5年	CAC（受注1件あたりの費用）を、受注した会社の粗利で何年で取り返すか。経営と決めます（記入例：1.5年＝18か月）
来期の全社の売上目標（万円）	150,000	経営の計画から写します
マーケ経由の割合	2.0%	全社の売上目標のうち、マーケ経由の受注で取る割合。経営と決めます
平均単価（万円）	250	新規の受注1件あたりの金額（年間の取引額）。回収期間とCACの上限にも使います
今期の実績：リード（件）	285	マーケ経由。期末までの見込みでかまいません
今期の実績：商談（件）	42	マーケ経由の商談
今期の実績：受注（件）	12	マーケ経由の受注
今期の実績：失注（件）	30	決着した商談のうち、受注できなかったもの。進行中の商談は入れません
商談化率（今期の実績・自動）	14.7%	＝商談÷リード
受注率（今期の実績・自動）	28.6%	＝受注÷（受注＋失注）。決着した商談だけで出します
CACの上限（自動・万円）	150	＝平均単価×粗利率×取り返す年数。受注1件あたりの費用（人件費込み）がこれ以下なら、決めた年数で取り返せます
許容CPL（自動・万円）	6.3	＝CACの上限×商談化率×受注率。施策のCPL（人件費込み）がこれ以下なら「上限内」

人件費（年額）と取り返す年数も、ここで入れます。

1 逆算の式

受注金額＝売上目標×マーケ経由の割合、受注件数＝受注金額÷平均単価、商談＝受注÷受注率、リード＝商談÷商談化率

2 受注率は決着した商談で

受注÷（受注＋失注）。進行中の商談は入れません。記入例は12÷42＝29%

3 判定の基準も決まる

CACの上限＝250万円×40%×1.5年＝150万円。許容CPL＝150×商談化率×受注率＝6.3万円

目標に届くまで、施策を並べる

③に施策を並べると、施策ごとのリードと率から商談・受注が積み上がり、①で目標に届くかが出ます。

年間計画シート（KPIと予算）｜目標を逆算し、必要な施策を決める

まとめ　商談（KPI）47件／目標42件　すべての目標に届く施策がそろっています。次は2_予算へ

① マーケの目標（②から逆算）と、施策の積み上げ

目標は、②の前提と今期の実績から自動で逆算されます（MQLだけはKPIツリーから写します）。右に、③の施策から積み上げた件数と、目標に届くかが出ます。

項目	目標	施策の積み上げ	差	判定	
受注金額（KGI）	3,000万円	3,300万円	+300	届く	＝全社の売上目標×マーケ経由の割合
受注件数（KGI）	12件	13件	+1	届く	＝受注金額÷平均単価
商談（KPI）	42件	47件	+5	届く	＝受注件数÷受注率
MQL	105件	119件	+14	届く	KPIツリーから写す（なければ空欄）
リード	285件	335件	+50	届く	＝商談÷商談化率
リード（チャネル別。目標はここに入れる）					
展示会	120件	170件	+50	届く	チャネル別の目標は、合計が上の「リード」の目標以上になるように振り分けます。チャネルの名前は、③のチャネルの選択肢になります。予実管理表と同じ名前にそろえます。
Web広告	65件	65件	0	届く	
自社サイト	60件	60件	0	届く	
メール・セミナー	40件	40件	0	届く	
					チャネル別の合計 285件：リードの目標以上

① 目標と施策の積み上げ（記入例は商談47件／目標42件で「届く」）

③ 必要な施策と、想定する件数

目標に届くまで施策を並べます。予算に収まるか分からない候補も入れておき、3_調整で外します。リードを生まない固定費（ツール・保守）も、リードを空けて入れます。率は施策ごとの直近の実績から出します。

施策	チャネル	区分	想定リード	MQL化率	商談化率（MQL→商談）	受注率	単価（万円）	MQL	商談	受注	受注金額（万円）	想定の根拠（メモ）
業界展示会（10月）	展示会	防衛	120	25%	40%	25%	300	30	12	3	900	前期の出展で有効リード120件（名刺180枚）
リスティング広告	Web広告	防衛	50	50%	40%	30%	200	25	10	3	600	クリック月640回×CVR 0.65%
自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	自社サイト	防衛										リードを生まない固定費
MAツール（運用・メルマガを含む）	メール・セミナー	防衛										リードを生まない固定費
記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	自社サイト	攻撃	60	38%	40%	33%	250	23	9	3	750	資料DL45件＋問い合わせ15件
ウェビナー（6・9・12・3月）	メール・セミナー	攻撃	40	63%	40%	30%	250	25	10	3	750	1回の申し込み9〜10人×4回
新しい業種向けのLP＋広告（試行）	Web広告	攻撃	15	20%	40%	25%	200	3	1	0	0	初めての業種なので控えめに置く
業界展示会の2回目（2月・小規模）	展示会	防衛	50	25%	40%	25%	300	13	5	1	300	候補。小間を小さくした場合の見込み

1 率は施策ごとの実績から

MQL化率・商談化率（MQL→商談）・受注率。実績がない施策は、近い施策の率を仮に置きます

2 候補も入れておく

予算に収まるかわからない施策も並べます。記入例は展示会の2回目（候補）を入れて47件

3 固定費はリードを空ける

MAツール・サイトの保守など、リードを生まない費用も1行にします

外部費用・実施する月・時間を入れる

「2_予算」に、外部に払う年間の費用、実施する月の◯、その施策にかける年間の時間を入れます。人件費が時間の比で配られ、施策ごとの費用合計・CPL・CAC・回収期間・ROIと判定が並びます。

① 施策ごとの費用（外部費用と人件費）と、実施する月

外部費用は外部に払う年間の額です。実施する月に○を付けると、費用とリードをその月に均等に割り振ります。時間は、その施策にかける年間の時間（マーケと、協力する営業の時間）。共通の作業（集計・報告、営業との連携、予算づくり）は入れません。人件費が時間

施策（1から）	チャネル	区分	外部費用（万円）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	時間（年間）	人件費（万円）	費用合計（万円）	想定リード	CPL	CAC	回収期間	ROI（1年）	判定（許容CPL）
業界展示会（10月）	展示会	防衛	280							○						120	54	**334**	120	2.8	111	13.4	+8%	上限内
リスティング広告	Web広告	防衛	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	48	22	**262**	50	5.2	87	10.5	-8%	上限内
自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	自社サイト	防衛	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	72	32	**68**	—	—	—	—	—	—
MAツール（運用・メルマガを含む）	メール・セミナー	防衛	84	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	240	108	**192**	—	—	—	—	—	—
記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	自社サイト	攻撃	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	112	50	**170**	60	2.8	57	6.8	+76%	上限内
ウェビナー（6・9・12・3月）	メール・セミナー	攻撃	60			○			○			○			○	120	54	**114**	40	2.9	38	4.6	+163%	上限内
新しい業種向けのLP＋広告（試行）	Web広告	攻撃	90				○	○	○	○	○	○				30	14	**104**	15	6.9	—	—	-100%	上限超え
業界展示会の2回目（2月・小規模）	展示会	防衛	200											○		80	36	**236**	50	4.7	236	28.3	-49%	上限内
合計（必要な予算）			1,110													822	370	1,480	335	4.4	114	13.7	-11%	上限内
うち防衛（外部費用／費用合計）	74%		840	割合（C列）は費用合計で出します。防衛：攻撃の目安は、導入期5：5、成長期7：3、安定期6：4。攻撃は上限額と止める基準を決めて小さく試し、成果が出たら翌年から防衛に移します。														1,092							
うち攻撃（外部費用／費用合計）	26%		270															388						

1 人件費は時間の比で配る

集計・報告など共通の作業は入れず、自動で配られます

2 判定は許容CPLと比べる

CPLが許容CPL以下なら上限内。記入例は新しい業種の試行だけ上限超え

3 合計が必要な予算

外部1,110万円＋人件費370万円＝1,480万円。上限に収めるのはSTEP3

上限を入れ、順位を見ながら施策を削る・足す

「3_調整」の①に予算の上限（外部費用）を入れます。③で「実施」を×にすると施策が外れ、その時間の分の人件費はほかの施策に配り直されます。

③ 施策ごとに調整し、止める基準を決める

「実施」を×にするとその施策が外れ、その時間の分の人件費はほかの施策に配り直されます。「費用を変える」に額を入れると、リード以下が外部費用に比例して増減します（空欄なら2_予算の額のまま）。順位は、リードを生む施策ほどリードを多く配分して算出（＝人件費込みのROIが高い順）。上限を超えたら、順位の低い施策から削る・外す。攻撃の施策は順位だけで外さない。上限額と止める基準を決めて小さく試す。余りがあり、KPIに届かなければ、順位の高い施策に足す。

施策	区分	2の外部費用	ROI（2）	順位	実施	外部費用を変える	調整後の外部費用	時間	人件費	費用合計	リード	MQL	商談	受注	受注金額	CPL	判定（許容CPL）
業界展示会（10月）	防衛	280	+8%	3位	○		280	120	60	340	120	30	12	3	900	2.8	上限内
リスティング広告	防衛	240	-8%	4位	○		240	48	24	264	50	25	10	3	600	5.3	上限内
自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	防衛	36	—	—	○		36	72	36	72						—	—
MAツール（運用・メルマガを含む）	防衛	84	—	—	○		84	240	119	203						—	—
記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	攻撃	120	+76%	2位	○		120	112	56	176	60	23	9	3	750	2.9	上限内
ウェビナー（6・9・12・3月）	攻撃	60	+163%	1位	○		60	120	60	120	40	25	10	3	750	3.0	上限内
新しい業種向けのLP＋広告（試行）	攻撃	90	-100%	6位	○		90	30	15	105	15	3	1	0	0	7.0	上限超え
~~業界展示会の2回目（2月・小規模）~~	~~防衛~~	~~200~~	~~-49%~~	~~5位~~	×		~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	—	—
合計		1,110					910	742	370	1,280	285	106	42	12	3,000	4.5	上限内

③ 施策ごとの調整（順位＝人件費込みのROIの高い順）

調整の順番

1. 上限を超えたら、順位の低い施策から削る・外す

2. 攻撃の施策は順位だけで外さない。上限額と止める基準を決めて小さく試す

3. 余りがあり、KPIに届かなければ、順位の高い施策に足す

記入例：上限910万円。展示会の2回目を外し、外部910＋人件費370＝1,280万円・商談42件・回収期間12.8か月

調整前と調整後を、人件費込みでくらべる

②に、外部費用・人件費・費用合計と、件数・CPL・CAC・回収期間・ROIが並びます。CAC・回収期間は、CACの上限（取り返す年数）とくらべて判定します。

② 調整前と調整後をくらべる（費用はすべて人件費込み）

項目	調整前（2_予算）	調整後	目標・上限	判定
外部費用（万円）	1,110	**910**	910	上限内（残り0万円）
人件費（万円）	370	**370**		人の数で決まるので、調整しても変わらない
費用合計（万円）	1,480	**1,280**		
商談（KPI）	47	**42**	42	届く
受注件数	13	**12**	12	届く
受注金額（万円）	3,300	**3,000**	3,000	届く
MQL	119	**106**	105	届く
リード	335	**285**	285	届く
CPL（万円）	4.4	**4.5**	6.3	上限内
CAC（受注1件あたり・万円）	114	**107**	150	上限内
回収期間（か月）	13.7	**12.8**	18.0	上限内
ROI（1年）	-11%	**-6%**		調整後に上がる

1 上限は外部費用で決める

人件費は人の数で決まるので、調整しても370万円のまま。上限は外部に払う費用で決めます

2 回収期間が主役

記入例は12.8か月で、取り返す年数（18か月）以内。経営にはまずこの数字を示します

3 ROIは1年で並べる

人件費込み・1年のROIは−6%。マイナスでも、回収期間が上限内なら取り返せます

施策ごとに、止める基準を先に決めておく

③の右側です。期が始まってから決めると、続けるか止めるかの判断が遅れます。予実管理表は、この基準で施策を自動で判定します。

③ 施策ごとに調整し、止める基準を決める

「実施」を×にするとその施策が外れ、その時間の分の人件費はほかの施策に配り直されます。「費用を変える」に額を入れると、リード以下が外部費用に比例して増減します（空欄なら2_予算の額のまま）。順位は、リードを生む施策のROI（人件費込み）の高い順です。右の止める基準は、予実管理表が判定に使います（判定月までの累計で件数を、期末に受注1件あたりを判定）。

施策	調整の理由	判定月	リード（以上）	商談（以上）	受注1件あたり（以下・期末）	届かないときにすること
業界展示会（10月）	防衛でROIが最も高い。このまま	12月		12	113万円	商談が届かなければ、MQLへの連絡（2営業日以内）を営業と確かめる。受注1件あたりが超えたら、次回の出展の規模を見直す
リスティング広告	現状維持				88万円	キーワードと広告文を、対象の規模に合わせて絞る
自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）						
MAツール（運用・メルマガを含む）						
記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	成果が出たら、翌期から防衛に移す	9月	15	2		下期は事例記事だけに絞る
ウェビナー（6・9・12・3月）	成果が出たら、翌期から防衛に移す	9月	10	2		下期は1回に減らす
新しい業種向けのLP＋広告（試行）	初めての業種なので、上限を決めて小さく試す（CPLは許容CPLを超える）	12月	10	1		翌期は止める
~~業界展示会の2回目（2月・小規模）~~	上限910万円に収めるため見送り（防衛でROIが最も低い）。翌期に再検討					

基準は使うものだけ入れます。固定費（ツール・保守）は空けておきます。

1 攻撃は件数と判定月

期首から判定月までの累計で判定。記入例の新しい業種の試行は「12月までにリード10件・商談1件」

2 防衛は受注1件あたりの上限

人件費込みで、期末に判定します。記入例の展示会は113万円以下（計画のCAC）

3 届かないときにすることまで

「翌期は止める」「下期は1回に減らす」など、決めた行動を書いておきます

03

計画を見て、予実管理につなぐ

年間計画／シナリオ／月別計画／予実管理表へ／実行プラン

経営への説明は、回収期間を主役に1枚で

入力はありません。3で決めた計画が、目標との比べ、費用（外部・人件費・合計）、人件費込みの判定、チャネル別・施策別にまとまります。



年間計画シート（KPIと予算）｜年間計画

期間	4月〜3月	費用合計 1,280万円	リード 285件	商談（KPI）42件	受注件数 12件	受注金額 3,000万円	回収 12.8か月

① 年間目標と計画

項目	目標	計画	差	判定
受注金額（万円）	3,000	3,000	0	届く
受注件数	12	12	0	届く
商談（KPI）	42	42	0	届く
MQL	105	106	+1	届く
リード	285	285	0	届く
人件費込みの判定	回収期間 12.8か月（取り返す年数 18か月以内）・ROI（1年）-6%			

費用（予算）	金額	割合	予算の上限（外部）
外部費用	910		910
人件費	370		上限内
費用合計	1,280		
うち防衛（費用合計）	879	69%	
うち攻撃（費用合計）	401	31%	
CAC 107万円／上限 150万円・CPL 4.5万円／許容 6.3万円			上限内

④ チャネル別の計画（人件費込み）

チャネル	外部費用	人件費	費用合計	リード目標	リード	MQL	商談	受注	受注金額	CPL	CAC	回収期間	ROI（1年）	判定（許容CPL）
展示会	280	60	340	120	120	30	12	3	900	2.8	113	13.6	+6%	上限内
Web広告	330	39	369	65	65	28	11	3	600	5.7	123	14.8	-35%	上限内
自社サイト	156	92	248	60	60	23	9	3	750	4.1	83	9.9	+21%	上限内
メール・セミナー	144	179	323	40	40	25	10	3	750	8.1	108	12.9	-7%	上限超え
合計	910	370	1,280	285	285	106	42	12	3,000	4.5	107	12.8	-6%	上限内

ツールや保守などの固定費も、チャネルの費用に入れています（記入例のMAツールはメール・セミナー）。費用はすべて人件費込み。判定は、CPLが許容CPL以下なら上限内。

1 費用は3行で見せる

外部費用910万円・人件費370万円・合計1,280万円。人件費を入れない計算はしません

2 回収期間とROIを並べる

回収期間12.8か月（18か月以内）、ROI（1年）−6%。CAC 107万円／上限150万円

3 チャネルも許容CPLで判定

記入例はメール・セミナーが8.1万円で上限超え。MAツールの費用をどう取り返すかを説明します

悲観・標準・楽観を並べ、悪いときの数字も先に見せる

商談化率と受注率を2割下げた・上げたときの、受注件数・CAC・回収期間・ROIが出ます。リードと費用は計画のままです。

⑥ シナリオ（悲観／標準／楽観）

標準＝今期の実績の率（1_施策の②）。悲観／楽観＝商談化率と受注率をそれぞれ2割下げる／上げる。リードと費用は計画のまま。経営には、悪いときにどこまで下がるかも並べて見せます。

シナリオ	商談化率	受注率	リード	商談	受注件数	受注金額	費用合計	CAC	回収期間	ROI（1年）	判定（CACの上限）	読み方
悲観	11.8%	22.9%	285	34	8	2,000	1,280	160	**19.2**	-38%	上限を超えている	商談化率と受注率が2割下がったとき
標準	14.7%	28.6%	285	**42**	**12**	3,000	1,280	107	**12.8**	-6%	上限内	今期の実績の率のとき
楽観	17.7%	34.3%	285	50	17	4,250	1,280	75	**9.0**	+33%	上限内	商談化率と受注率が2割上がったとき

商談＝リード×商談化率、受注＝商談×受注率（それぞれ四捨五入）、受注金額＝受注件数×平均単価。悲観でCACの上限を超えるときは、止める基準と、届かないときにすることを先に決めておきます。

1 標準は今期の実績の率

商談42件・受注12件・回収期間12.8か月

2 悲観で上限を超える

受注8件でCAC 160万円・回収期間19.2か月。
CACの上限150万円を超えます

3 先に決めておくこと

悲観に近づいたときに止める施策と、届かないときにすることを、稟議の前に決めておきます

毎月の会議は、月を選んで今月の計画を見る

2行目で月を選ぶと、その月の数字と期首からの累計、施策別・チャネル別の計画に切りかわります。



年間計画シート（KPIと予算）｜月別計画

月を選ぶ: 11月

費用合計 85万円 | リード 12件 | 商談（KPI）11件 | 受注件数 0件 | 受注金額 0万円

① 月別と年間の計画

数字	11月	期首からの累計	年間の計画	進み具合（累計÷年間）
外部費用（万円）	55	705	910	77%
人件費（万円）	30	246	370	66%
費用合計（万円）	85	951	1,280	74%
リード	12	226	285	79%
MQL	5	78	106	74%
商談（KPI）	11	29	42	69%
受注件数	0	6	12	50%
受注金額（万円）	0	1,400	3,000	47%

商談と受注は、前の月までのリードから生まれる分です。期首の数か月は、前期も同じ計画だったとみなした数です。人件費は毎月同じだけかかります。

期が始まったら、6_予実管理表への表を予実管理表に貼り、毎月の実績と比べます。

③ 施策別の計画

施策	チャネル	区分	外部費用	人件費	費用合計	リード	MQL	商談	受注	受注金額	CPL（累計）	CAC（累計）	回収期間（累計）	ROI（累計）	判定（累計）	実施
業界展示会（10月）	展示会	防衛	0	5	5	0	0	7	0	0	2.7	—	—	-100%	上限内	—
リスティング広告	Web広告	防衛	20	2	22	4	2	1	0	0	5.3	88	10.6	-9%	上限内	実施
自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	自社サイト	防衛	3	3	6	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	実施
MAツール（運用・メルマガを含む）	メール・セミナー	防衛	7	10	17	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	実施
記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	自社サイト	攻撃	10	4	14	5	2	1	0	0	2.9	59	7.0	+71%	上限内	実施
ウェビナー（6・9・12・3月）	メール・セミナー	攻撃	0	5	5	0	0	1	0	0	3.5	35	4.2	+186%	上限内	—
新しい業種向けのLP＋広告（試行）	Web広告	攻撃	15	1	16	3	1	1	0	0	6.5	—	—	-100%	上限超え	実施
~~業界展示会の2回目（2月・小規模）~~	~~展示会~~	~~防衛~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	—	—	—	—	—	見送り

1 商談・受注は後の月に出る

商談はリードの翌月6割・翌々月4割、受注は商談の3か月後。10月の展示会の商談は11・12月に出ます

2 人件費は毎月かかる


外部費用は実施する月、人件費は12か月に均等に置いています

3 「実施」は今月お金を使う施策

2_予算で○を付けた月に「実施」と出ます

期が始まったら、計画を予実管理表に貼る

計画はこのシート、毎月の実績は予実管理表（KPI達成率×ROI）で管理します。予実管理表の「1_入力」と同じ並びになっています。

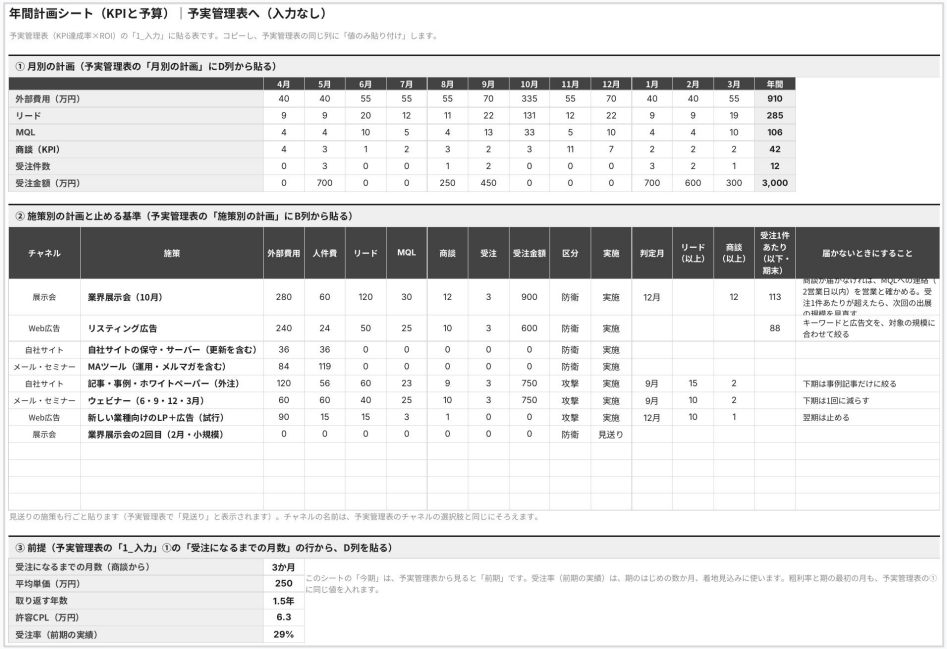

年間計画シート（KPIと予算）｜予実管理表へ（入力なし）

予実管理表（KPI達成率×ROI）の「1_入力」に貼る表です。コピーし、予実管理表の同じ列に「値のみ貼り付け」します。

① 月別の計画（予実管理表の「月別の計画」にD列から貼る）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
外部費用（万円）	40	40	55	55	55	70	335	55	70	40	40	55	910
リード	9	9	20	12	11	22	131	12	22	9	9	19	285
MQL	4	4	10	5	4	13	33	5	10	4	4	10	106
商談（KPI）	4	3	1	2	3	2	3	11	7	2	2	2	42
受注件数	0	3	0	0	1	2	0	0	0	3	2	1	12
受注金額（万円）	0	700	0	0	250	450	0	0	0	700	600	300	3,000

② 施策別の計画と止める基準（予実管理表の「施策別の計画」にB列から貼る）

チャネル	施策	外部費用	人件費	リード	MQL	商談	受注	受注金額	区分	実施	判定月	リード（以上）	商談（以上）	受注1件あたり（以下・期末）	届かないときにすること
展示会	業界展示会（10月）	280	60	120	30	12	3	900	防衛	実施	12月		12	113	商談が届かなければ、同じ人への連絡（2営業日以内）を営業と確かめる。受注1件あたりが超えたら、次回の出展の規模を縮小する
Web広告	リスティング広告	240	24	50	25	10	3	600	防衛	実施				88	キーワードと広告文を、対象の規模に合わせて絞る
自社サイト	自社サイトの保守・サーバー（更新を含む）	36	36	0	0	0	0	0	防衛	実施					
メール・セミナー	MAツール（運用・メルマガを含む）	84	119	0	0	0	0	0	防衛	実施					
自社サイト	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	120	56	60	23	9	3	750	攻撃	実施	9月	15	2		下期は事例記事だけに絞る
メール・セミナー	ウェビナー（6・9・12・3月）	60	60	40	25	10	3	750	攻撃	実施	9月	10	2		下期は1回に減らす
Web広告	新しい業種向けのLP＋広告（試行）	90	15	15	3	1	0	0	攻撃	実施	12月	10	1		翌期は止める
展示会	業界展示会の2回目（2月・小規模）	0	0	0	0	0	0	0	防衛	見送り					

見送りの施策も行ごと貼ります（予実管理表で「見送り」と表示されます）。チャネルの名前は、予実管理表のチャネルの選択肢と同じにそろえます。

③ 前提（予実管理表の「1_入力」①の「受注になるまでの月数」の行から、D列を貼る）

受注になるまでの月数（商談から）	3か月
平均単価（万円）	250
取り返す年数	1.5年
許容CPL（万円）	6.3
受注率（前期の実績）	29%

このシートの「今期」は、予実管理表から見ると「前期」です。受注率（前期の実績）は、期のはじめの数か月、着地見込みに使います。粗利率と期の最初の月も、予実管理表の①に同じ値を入れます。

1 ①月別の計画

D〜O列をコピーし、予実管理表の「月別の計画」にD列から貼る

2 ②施策別と止める基準

B〜Q列を「施策別の計画」にB列から貼る。人件費も一緒に入ります

3 ③前提

D列を、予実管理表の①「受注になるまでの月数」の行から貼る

貼るときは「値のみ貼り付け」。見送りの施策も行ごと貼ります。

予実管理表をダウンロード →

期のはじめに、4日で計画を仕上げる

予算の上限が決まる前でも、DAY1〜2は進められます。上限が決まったらDAY3で収めます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
施策｜1時間	予算｜1時間	調整｜1時間	説明｜30分
シートをコピーし、前提と今期の実績を入れて目標を逆算する。届くまで施策を並べる	施策ごとの見積もりと、かける時間を集め、外部費用・実施する月・時間を入れる	上限を入れて削る・足す。回収期間とシナリオを確かめ、止める基準を決める	年間計画の1枚で経営と合意し、期が始まったら予実管理表に貼る
☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日

今日やること：シートをコピーし、「1_施策」の②に今期の実績（リード・商談・受注・失注）を入れる（15分）

さいごに

目標を前年の数字から決め、人件費を入れずに予算を組むと、「その額で取り返せるのか」に答えられません。今期の実績から逆算し、施策ごとに件数と人件費込みの費用を1つの表でつなげば、上限が変わっても、どの施策を残すかを数字で決められます。

計画ができたら、毎月の実績と比べて、届いたか・お金は効いたかを確かめていきます。

次は、予実管理表で毎月の実績と比べる

施策ごとの実績を毎月1か所に入れるだけで、KPI達成率・予算の消化率・回収期間と、受注の着地見込みがそろいます。このシートの計画をそのまま貼って使えます。

予実管理表をダウンロード →
