
MKTG.AX

期の途中で、予算が足りなくなったら

稟議書テンプレート（期中の追加予算）

5つの項目と例文で、「何件増えて、いつ止めるか」を書く

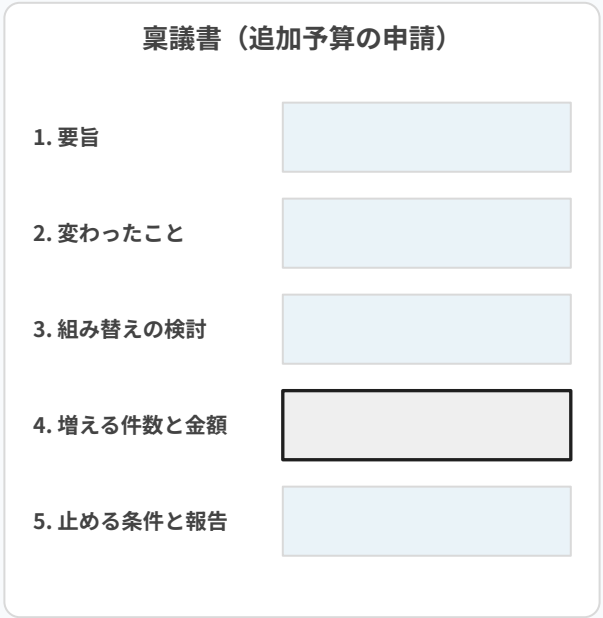

ひな形をコピーして使う →

Googleドキュメント｜コピーのしかたは5ページ

期中の追加予算を、期初の計画の変更として書く

期の途中でマーケ予算を追加するときの稟議書のひな形です。決裁者が確かめる5つの項目に、期初の計画と同じ数字を写して書きます。

Before

~~新しい投資として書く~~

~~「追加しないと届かない」~~

~~広告費だけを申請額にする~~

→

After

1. **変わったことと組み替えの検討から書き始められる**
2. **件数から額を逆算し、今期と来期に分けて示せる**
3. **人件費込みの費用で、取り返せるかと止める条件を示せる**

手に入るもの

ひな形	稟議書（Word・Googleドキュメント）
例文	5つの項目の記入例
別紙	計算の前提と写し元
ガイド	この使い方ガイド

所要時間：数字がそろっていれば1時間ほど

目次

01 ひな形を用意する

02 5つの項目を書く

03 説明して、通す

01

ひな形を用意する

コピーのしかたとマスの色／5つの項目と写す数字

コピーして、マスの色を覚える

配布しているひな形は閲覧のみです。自分のGoogleドライブにコピーしてから使います。

コピーのしかた

1 リンクを開く

下記の「ひな形をコピーして使う」ボタンから開きます。Googleアカウントにログインしておきます。

コピーする →

2 コピーを作成する

「コピーを作成」を押します。出ないときは「ファイル」→「コピーを作成」。

3 名前をつけて保存

「追加予算の稟議_12月」のように、件名と月がわかる名前にします。Wordで使うときは「ファイル」→「ダウンロード」→「Microsoft Word」。

マスの色

水色

書きかえる箇所。灰色の文字は記入例

太い枠＋灰色

いちばん見る数字（申請額・費用合計）

黄色

あわせて見る数字（CPL・CAC・回収期間）

冒頭の「このひな形の使い方」の枠は、提出するときに消します。

5つの項目は、期初の計画と毎月の実績から写して書く

数字を新しく作らないのがポイントです。率と単価は期初の計画（年間計画シート）、実績は予実管理表から写します。

項目	書くこと	写す数字	写し元
1. 要旨	額・目的・期限	費用合計、増える商談数	この稟議書の4
2. 期初の計画から変わったこと	何が想定と違ったか。なぜ期初に見込めなかったか	想定と実績の差（件数・単価）	予実管理表の月次報告
3. 組み替えの検討	今期の予算内で回せないか	残りの予算と施策ごとの判定	予実管理表の施策の評価
4. 増える件数と金額	件数から逆算した額。今期と来期の分け方	受注率・MQL化率・MQL→商談の率、CACの上限・許容CPL	年間計画シートの「1_施策」
5. 止める条件と報告	どの数字を下回ったら止めるか。いつ報告するか	最初の1か月のリード数	この稟議書の4

会社の様式が決まっているとき：要旨は件名と冒頭、2と3は申請理由、4と5は効果の欄に振り分けます。別紙はそのまま添えます。

02

5つの項目を書く

STEP1 要旨と変わったこと／STEP2 件数と額／STEP3 取り返せるか／STEP4 止める条件

要旨のあとは「変わったこと」と「組み替え」から書く

決裁者が最初に考えるのは「なぜ期初に入れなかったのか」「今の予算の中で回せないのか」です。ここに答えてから、額の話に入ります。

追加の理由	決裁者が疑うこと	「変わったこと」に書くこと
見込み違い（リード単価の上昇など）	下期も同じことが起きないか	原因と、計画の前提をどう直したか
機会（成果の出ている施策を伸ばす）	どこまで伸ばすのか	上限額と期限。伸ばす根拠になった件数
人手不足（外注を使いたい）	人を足せば成果が出るのか	人が足りずに止まっている仕事と、足した場合に増える件数

記入例（機会）

要旨：「下期のWeb広告に90万円（人件費を含めて105万円）を追加し、来期の期初までに商談4件を作ります。」
変わったこと：「上期の広告で、商談になりやすい業種が見つかりました。期初の計画には入っていなかった業種です。」

書かないこと：「追加しなければ目標に届かない」。未達の見込みは月次の報告で先に伝えておきます。

増やしたい受注の件数から、期初と同じ率で逆算する

率と単価は年間計画シートの値をそのまま使います。追加分だけ都合のよい率を置くと、期初の計画との違いを問われます。

受注 例）1件 ÷ 受注率29% → 商談 例）4件 ÷ MQL→商談 40% → MQL 例）10件 ÷ MQL化率 37% → リード 例）28件

件数は段階ごとに切り上げます（1÷29%＝3.4→4件、10÷37%＝27.0→28件）

費用	金額	出し方
外部に払う費用	例）90	例）広告の出稿60＋LPの制作30（見積もり）
人件費	例）15	例）LPの企画・監修と広告の確認にかける30時間×経理と決めた単価
費用合計	**例）105**	申請額。外部に払う費用と人件費を別の行に書き、合計も示す

※ 記入例は、産業機械向けの部品メーカー（従業員100名・4月始まり）が下期にWeb広告を追加する場面を想定した架空の数字です。金額の単位は万円です。

取り返せるかを上限で確かめ、今期と来期に分ける

追加分の費用を、期初の計画で決めた上限と比べます。受注が来期に入るなら、今期に増えるのは費用だけだと先に書きます。

見る数字	追加分（記入例）	上限（年間計画シート）	判定
リード1件あたり（CPL）	3.8万円（105÷28）	許容CPL 6.3万円	**上限内**
受注1件あたり（CAC）	105万円	CACの上限 150万円	**上限内**
回収期間	12.6か月（105÷8.3）	取り返す年数 18か月	**上限内**

許容CPL＝CACの上限×商談化率×受注率。CACの上限＝1社あたりの年間粗利100万円×取り返す年数1.5年

今期に増えるもの

例）費用合計105万円（外部90＋人件費15）。今期の受注は増えない見込み

来期に持ち越すもの

例）商談4件・パイプライン創出額1,000万円（4件×250万円）。受注は来期の第1四半期

見落としやすいこと：リードから受注まで4か月なら、4月始まりの会社で12月以降に取ったリードの受注は来期に入ります。

止める条件を自分から先に出し、最初の分だけ使う

期初に撤退ラインを決めていなかった施策ほど、決裁者は「いつまで続くのか」を気にします。止める数字と、先に使う額を書きます。

1 止める条件

例）最初の1か月（12月末）でリードが10件に届かなければ、残りの執行を止める

2 先に使う額

例）最初の1か月分：広告の出稿30万円とLPの制作30万円。残りは結果を見て判断してもらう

3 報告

例）結果は毎月の報告（リード・商談の件数と費用）に含める

実績が弱い施策に追加するときは、詰まった段階を件数で示す

詰まった段階	件数で示すこと	追加で変えること
リードが足りない	計画と実績のリード数	リードを集める施策・額
リードは取れるが商談にならない	MQL化率・MQL→商談の率	MQLの条件、営業への渡し方

03

説明して、通す

財務と社長への一文／仕上がりチェック／実行プラン

財務には今期の利益への影響を、社長には増える件数と止める時期を

同じ数字で、先に見せるものだけを変えます（記入例は架空の数字）。

財務担当に

「追加は外部に払う費用90万円と人件費15万円の合わせて105万円で、今期の費用に入ります。受注は来期の第1四半期になる見込みです。今期の利益の見通しへの影響は、この費用の分だけです。」

社長に

「追加の105万円（うち外部に払う費用90万円）で商談を4件作ります。最初の1か月でリードが10件に届かなければ、残りは使わずに止めます。」

期中の追加は原則認めないと言われたら：今期の予算内の組み替えで対応できる範囲を示し、足りない分は来期の予算案に回します。組み替えで得た件数と単価は、来期の根拠に使えます。

出す前の仕上がりチェック

8つすべてにチェックが入れば合格です。入らなかった項目は、該当するSTEPに戻って直します。

- STEP1 ☐ 要旨に、額（人件費込みの合計も）・目的・期限がある
- STEP1 ☐ 組み替えを検討した結果を書いている
- STEP2 ☐ 費用を外部に払う費用・人件費・合計の3行で書いた
- STEP3 ☐ 今期に増えるものと、来期に持ち越すものを分けた
- STEP1 ☐ 「追加しなければ届かない」と書いていない
- STEP2 ☐ 率と単価は、期初の計画と同じ値を使った
- STEP3 ☐ CPL・CAC・回収期間が上限以内か確かめた
- STEP4 ☐ 止める条件・先に使う額・報告の時期を書いた

合格ライン：8つすべてにチェック　→　「このひな形の使い方」の枠を消し、経理・財務の確認を経て決裁者に出す

3日で稟議書を仕上げて出す

追加が必要だとわかった週に始めます。月次の報告で未達の見込みを伝えたあとに出すと、話が早く進みます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3
集める｜30分	書く｜1時間	確かめる｜30分
年間計画シートの率・上限と、予実管理表の実績を手元にそろえる	5つの項目を書き、件数から逆算して費用を3行で出す	上限と比べ、仕上がりチェックのあと経理・財務に見てもらう
☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日

今日やること：ひな形をコピーし、増やしたい受注の件数と、期初の計画の率を書き出す（15分）

さいごに

期中の追加予算は、新しい投資として書くと「なぜ期初に入れなかったのか」で止まります。期初の計画から何が変わったかを示し、同じ率で件数から額を出し、止める条件を先に出しましょう。

追加の稟議が通るかどうかは、稟議書を書く前の毎月の報告で、ほぼ決まっています。

率と上限は、年間計画シートから

今期の実績から目標を逆算し、人件費込みの施策と予算、CACの上限と許容CPLを1つの表にまとめるシートです。このひな形の別紙と同じ数字が入っています。

年間計画シートをダウンロード →
