

部門の立ち上げ・着任から

90日計画 テンプレート

マーケ責任者が最初の3か月でやる8つのこと

90
DAYS

1-30日
1 決める ステップ1〜4

31-60日
2 絞る ステップ5〜6

61-90日
3 仕組みにする ステップ7〜8

着任から90日の動き方を、この1冊で決める

部門の立ち上げや責任者への着任が決まったときに、最初の3か月で「何を、どの順番で、誰と決めるか」をまとめたテンプレートです。

Before

——「まず広告を」と頼まれ、依頼から動いてしまう——

——「何が変わったのか」に答えられない——

——前任者の業務を全部抱え、手が回らない——



After

- ✓ ミッションと3か月ゴールを、経営陣と合意している
- ✓ 注力する課題が1〜2個に絞られ、小さな成果が出ている
- ✓ 決めたことが、細かく指示しなくても回っている

この資料で手に入るもの

8つのステップの進め方

記入シート（記入例つき）

「90日計画」の1枚シート

報告の型と会議体の例

目次

- 01** 90日の全体像
- 02** 1か月目：決める
- 03** 2か月目：絞る
- 04** 3か月目：仕組みにする

01

90日の全体像

全体の流れ／つまずきやすい点／90日計画の1枚／13週の予定表／最初の5日間


施策より先に、ミッションとゴールを経営陣と合意する

8つのステップは、前のステップの結果を次で使う順番です。期間の区切りは目安で、会社の規模や前任者の有無で前後してかまいません。

期間	やること	誰と決めるか	終わったときの状態
1か月目 決める 1～30日	1. 部のミッションを決める 2. メンバーと業務の現状をつかむ 3. 直近3か月のゴールを決める 4. メンバーの役割を決める	経営陣、メンバー	ミッションと3か月ゴールを経営陣と合意し、誰が何を担うかがメンバーに伝わっている
2か月目 絞る 31～60日	5. ボトルネックを特定し、注力する課題を絞る 6. 業務の優先順位、やめること、クイックウィンを決める	メンバー、営業部長	注力する課題が1～2個に絞られ、最初の小さな成果が出ている
3か月目 仕組みにする 61～90日	7. 業務プロセスを標準化する 8. 評価のルールと会議体を決める	メンバー、経営陣	決めたことが、責任者が細かく指示しなくても回る形になっている

期間を通して：経営陣への報告を定期的に行います。頻度は、社内の会議の周期に合わせて決めてください。

順番は入れ替えない。つまずきやすい4つの点

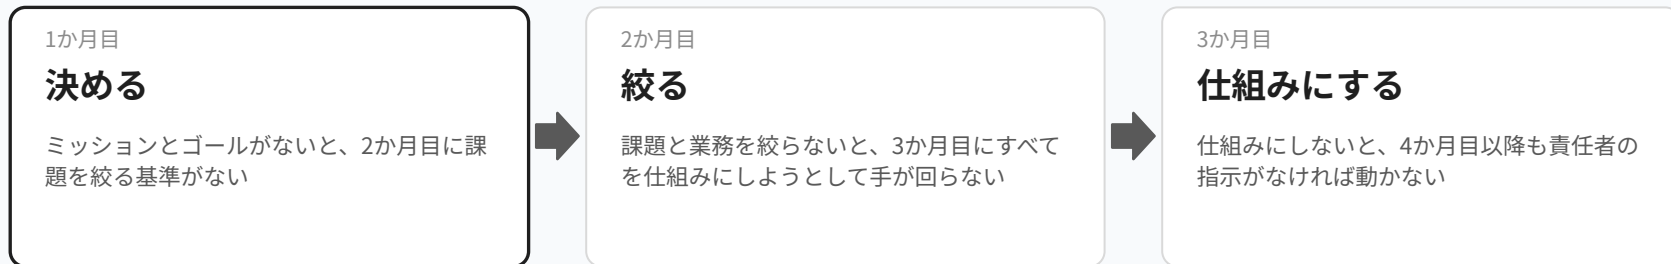

つまずきやすい4つの点

1 合意より先に、施策やツールに手をつける

ゴールがないと、うまくいったか判断できない。施策はステップ3でゴールを合意してから

2 経営陣との合意を、着任時の1回で終わらせる

状況が変われば関心も変わる。定期的な報告で、進み具合とずれを確かめる

3 ルールや手順を、責任者ひとりで決めて配る

現場の事情に合わず使われなくなる。責任者は目的を示し、中身はメンバーと決める

4 前任者の業務を、すべて引き継ぐ

新しい課題に手が回らない。ステップ6でやめる業務を決め、了承を得て時間をあける

90日目にこの1枚が埋まっていれば完成

8つのステップで決めたことを1枚にまとめます。薄い文字の記入例（従業員100名の部品メーカー、マーケティング部門3名を想定した架空の例）を上から書きかえて使ってください。

項目	書く内容	記入欄（記入例）
ミッション ステップ1	経営計画のどの目標の、どの部分を担うか（1～2文）	例）中期経営計画の「新規顧客からの売上を3年で1.5倍」のうち、新規の商談をつくる部分を担う
3か月ゴール ステップ3	数字の改善と仕組みの整備を1つずつ	例）商談化率を20%から30%に戻す／リードから受注までの数字を同じ形で定期的に報告できる状態にする
現状 ステップ2	メンバーのスキル、進行中の業務、課題	例）展示会の運営とWebサイトの更新で手一杯。リードを営業に渡したあとの結果が記録されていない
役割 ステップ4	誰が何を担うか（暫定）	例）責任者：ゴールの管理と経営陣への報告／Aさん：リードの管理と営業への引き渡し／Bさん：展示会とWebサイト
ボトルネックと注力する課題 ステップ5	どの段階が弱く、何に絞るか	例）商談化率の低下。営業が連絡するまでの日数と、渡す条件のずれに絞る
やめること ステップ6	やめる・減らす業務と、了承を得た相手	例）反応を測っていないメールマガジンを月2回から月1回に減らす（社長の了承済み）
クイックウィン ステップ6	1か月以内に結果が出る取り組みと担当	例）資料請求から2営業日以内に営業が連絡するルールを営業部長と決める（担当：Aさん）
業務プロセス ステップ7	標準化する業務と、1枚にまとめる期限	例）リードの引き渡し、月次の集計（11週目までに）
評価のルール ステップ8	数字と行動で、何ができたら評価するか	例）Aさん：商談化率と、引き渡しルールの運用／Bさん：展示会からの商談数と、Webサイト更新の手順づくり
会議体 ステップ8	会議ごとの頻度、参加者、決めること	例）週1回の定例、月1回の営業との共有、経営会議に合わせた経営陣への報告

13週の予定表に、日付を書き込む

	1か月目 決める				2か月目 絞る				3か月目 仕組みにする				
週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
週のはじめの日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ステップ1 ミッションを決める													
ステップ2 メンバーと業務の現状をつかむ													
ステップ3 3か月ゴールを決め、合意する													
ステップ4 メンバーの役割を決める													
ステップ5 ボトルネックと注力する課題													
ステップ6 やめること・クイックウィン													
ステップ7 業務プロセスの標準化													
ステップ8 評価のルールと会議体													
経営陣への報告	-----				社内の会議の周期に合わせて定期的に				-----				

期間の区切りは目安です。前後してもかまいませんが、ステップの順番は入れ替えないでください。

最初の5日間でやること

着任したら、まずこの5日で1か月目の土台をつくります。終わったら、チェックを入れて日付を書き込んでください。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5
計画を読む 中期経営計画と単年度計画を読み、マーケティング部門の位置づけと担う数字を確認める 月 日	期待を聞く 経営陣や前任者に、マーケティング部門に何を期待しているかを聞く 月 日	1対1を始める メンバー全員と1対1で話す時間を押さえ、1人目と話す 月 日	数字を確認める リード・商談・受注の数字が、どの段階まで取れているかを確認める 月 日	案を書く 確かめた結果をもとに、ミッションの案を1〜2文で書いてみる 月 日

今日やること：経営計画を手元にそろえ、4週目に経営陣と合意する場の日程を押さえる

02

1か月目：決める

ステップ1 ミッション／ステップ2 現状／ステップ3 3か月ゴール／ステップ4 役割

経営計画を読み、部のミッションを決める



最初に中期経営計画と単年度計画を読み、マーケ部門の位置づけを確かめます。確かめた結果によって、動き方が分かります。

確かめる3つのこと

- 1 計画の中に、マーケ部門のミッションや担う数字が書かれているか
- 2 書かれている場合、それが今の計画の目標（売上、新規顧客数など）に沿っているか
- 3 経営陣や前任者が、マーケ部門に何を期待しているか

確かめた結果	責任者がやること
ミッションがあり、計画の目標とつながっている	そのまま引き継ぎ、ステップ3で3か月ゴールに落とす
ミッションはあるが、古い、または計画の目標とずれている	今の計画に合わせた修正案を作り、経営陣に確認する
ミッションがない（部門の立ち上げ直後など）	計画の目標のうちマーケ部門が担う部分を選び、ミッションの案を作って経営陣に提案する

まとめ方：「〇〇という経営目標のうち、〇〇の部分を担当」という1～2文にする

ミッションを1～2文にまとめる

確かめること	結果（○をつける）	メモ
マーケティング部門のミッションや担う数字が書かれているか	ある ・ ない	例）中期経営計画に「新規顧客からの売上を3年で1.5倍」とあるが、マーケティング部門の役割は書かれていない
今の計画の目標に沿っているか	沿っている ・ ずれている	
経営陣や前任者の期待	—	例）展示会や紹介以外からの新規の商談を増やしてほしい（社長）

ミッション

「中期経営計画の「新規顧客からの売上を3年で1.5倍」」という経営目標のうち、
「新規の商談をつくる」の部分を担当。

☐ 経営陣に確認した日 月 日

☐ ステップ3の合意の場合で了承を得た日 月 日

メンバー全員と1対1で話し、現状をつかむ



ミッションの案づくりと並行して進めます。聞いた内容は、ステップ4の役割決めや、ステップ7のルールづくりにも使います。

聞くこと	Aさん	Bさん	さん
担当している業務と、かけている時間	例) リードの管理、営業への引き渡し（週10時間）	例) 展示会の運営、Webサイトの更新（ほぼ全部）	
止まっている業務、困っていること	例) 営業に渡したリードのその後がわからない	例) サイト更新の依頼が多く、後回しになる	
引き継いだが、目的がわからない業務	例) 月2回のメールマガジン	例) 特になし	
得意なこと、これから担いたいこと	例) 数字の集計。営業との連携を担いたい	例) 制作。展示会の企画も担いたい	

数字がどこまで取れているか（取れている段階にチェック）

☐ リードの数
 ☐ 商談の数
 ☐ 受注の数
 ☐ リードごとの商談・受注の結果

取れていない段階があれば、それ自体が課題の1つです。

3か月ゴールを決め、経営陣と合意する



着任直後の3か月で受注や売上を大きく動かすのは難しいものです。「数字の改善」と「仕組みの整備」を1つずつ組み合わせます。

	3か月ゴール	90日後に確かめる方法
数字の改善	例) 商談化率を20%から30%に戻す	例) 直近1か月の商談化率が30%以上
仕組みの整備	例) リードから受注までの数字を、同じ形で定期的に報告できる状態にする	例) 同じ形の報告を、決めた周期で続けられている

ゴールは、ミッションにつながり、90日後に達成したかどうかを数字や状態で確かめられるものにします。

会社の状況は3か月の間にも変わります。合意は1回で終わりにせず、定期的な報告で進み具合とずれを確かめます。

合意の場で確かめる4つ

- ☐ ミッション
- ☐ 3か月ゴールと、それを測る数字
- ☐ 使える予算と人員
- ☐ 報告の頻度
- ☐ 合意した日 月 日

責任者が持つ仕事を先に決め、残りを任せる

ゴールに必要な仕事を書き出し、メンバーの得意なこと・担いたいことと突き合わせて割り振ります。この時点の役割は暫定でかまいません。

責任者が持つ仕事

☐ ミッションとゴールの管理

☐ 経営陣への報告

☐ 施策の優先順位づけ

☐ _____

これ以外の仕事をメンバーに任せる



担当	担う仕事	得意なこと・担いたいことと合っているか
Aさん	例) リードの管理と営業への引き渡し	例) 数字の集計が得意。営業との連携を担いたい
Bさん	例) 展示会とWebサイト	例) 制作が得意。展示会の企画も担いたい

役割は3か月目に、評価のルールとあわせて見直します。

03

2か月目：絞る

ステップ5 ボトルネックと注力する課題／ステップ6 やめること・クイックウィン

今と1年前を並べ、いちばん弱い段階を探す



ボトルネックは、成果を止めているいちばん弱い段階です。リードから受注までの段階ごとに、今の数字と1年前の数字を並べます。

段階	今（月平均）	1年前（月平均）	見え方
リード（問い合わせ・資料請求）	60件	55件	やや増えている
商談化率（リード→商談）	20%（12件）	35%（19件）	大きく下がっている
受注率（商談→受注）	17%（2件）	18%（3件）	ほぼ変わらない

※従業員100名の製造業を想定した架空の数字

この例の読み方

リードは増えているのに、商談が減っている。

ボトルネックは商談化率

次に見るもの

商談にならなかったリードの内訳（業種・規模・内容）

→ 偏りがあれば、集め方に原因

営業が最初に連絡するまでの日数

→ 長ければ、引き渡し後のフォローに原因

自社の数字を並べ、注力する課題を1～2個に絞る



段階	今の数字（月平均）	1年前の数字（月平均）	見え方
リード	例）60件	例）55件	例）やや増えている
商談化率（リード→商談）			
受注率（商談→受注）			

注力する課題（1～2個）

課題1 例）商談化率の低下。営業が連絡するまでの日数と、渡す条件のずれに絞る

課題2

選ぶ基準（両方にチェック）

☐ 3か月ゴールに直接効く

☐ 残りの2か月で手を打てる

営業が関わる課題なら、この段階で営業部長に共有する

☐ 共有した日 月 日

業務を3つに分け、やめることを決める



ステップ2で書き出した業務を、ミッションと注力する課題につながるかどうかで分けます。

業務	続ける	やめる・減らす	あとで判断	了承を得た相手
例) リードの営業への引き渡し	○			
例) メールマガジン（月2回）		月1回に減らす		社長
例) 展示会の運営	○			

やめる候補になる業務

- 1 ミッションにも3か月ゴールにもつながらない
- 2 成果を測っておらず、続ける理由を誰も説明できない
- 3 前任者の時代から続いているが、目的がわからない

経営陣や営業から頼まれている業務は、報告の場で理由を伝え、了承を得てからやめる

クイックウインを1～2個選び、メンバーに任せる

クイックウインは、早く結果が出る小さな成果です。報告では、担当したメンバーの名前と一緒に結果を伝えます。

選ぶ基準（4つすべてにチェック）

- ☐ 1か月以内に結果が見える
- ☐ 注力する課題か、経営陣が気にしている数字に効く
- ☐ 今の人員と予算でできる
- ☐ うまくいなくても影響が小さい

商談化率が課題の場合の例

資料請求から営業が連絡するまでの日数を決め、そろえる

商談にならなかったリードを営業と見直し、渡す条件をそろえる

問い合わせフォームに「検討の時期」の項目を足す

クイックウィン	担当	結果を見る日	結果
例) 資料請求から2営業日以内に営業が連絡するルールを営業部長と決める	例) Aさん	月 日	
		月 日	

04

3か月目：仕組みにする

ステップ7 業務の標準化／ステップ8 評価のルールと会議体／報告の型／仕上がりチェック

くり返す業務を、メンバーと一緒に1枚にまとめる



進め方

- 1 責任者が、業務の目的と、守る数字や期限だけを示す
- 2 メンバーが手順を書き出す
- 3 全員で確かめて決める

対象にする業務

ステップ6で「続ける」とした業務のうち、毎週・毎月くり返すもの。

例：リードの引き渡し、月次の集計、他部署からの依頼の受け方

業務名	例) リードの引き渡し
目的	例) 見込みのあるリードを、時間をあけずに営業へ渡す
担当	例) Aさん（マーケ）→ 営業担当
手順	例) ① 資料請求を確かめる ② 渡す条件に合うかを見る ③ 営業に引き渡し、日付を記録する
完了の基準	例) 営業が2営業日以内に連絡し、その結果が記録されている
期限	例) 11週目までに1枚にまとめる

ルールを上から配ると、現場の事情に合わず使われなくなりやすいもの。手順はメンバーと決めます。

評価のルールと会議体を決める



メンバー	数字で見ること	行動で見ること
Aさん	例) 商談化率	例) 引き渡しルールの運用
Bさん	例) 展示会からの商談数	例) Webサイト更新の手順づくり

決めた手順を守れたか、課題を早く共有できたかといった行動も入れると、結果の出にくい仕事も担いやすくなります。

会議	頻度（目安）	参加者	その場で決めること
チームの定例	週1回（30分）	責任者、メンバー	進み具合の確認と、止まっている仕事の手の打ち方
1対1の面談	月1～2回	責任者、メンバー1人	評価のルールに沿った振り返りと、次に担う仕事
営業との共有	月1回	責任者、営業部長	注力する課題の数字と、営業に渡したリードの結果
経営陣への報告	社内の会議の周期に合わせる	責任者、経営陣	ゴールの進み具合と、経営陣に判断してほしいこと

頻度は目安です。90日を終えたら役割とあわせて見直し、次の3か月のゴールを経営陣と合意します。

報告は毎回同じ形にし、説明の一文を用意する

報告を毎回同じ形にしておくと、経営陣が前回と比べやすくなります。

報告に入れる5つ	今回の内容
1. 3か月ゴールの進み具合（数字）	例）商談化率 20% → 24%
2. 前回からやったことと、その結果	例）連絡ルールを始めた（担当：Aさん）
3. わかったこと	例）商談にならないリードは、検討の時期が決まっていないものが多い
4. 次回までにやること	例）渡す条件を営業部長とそろえる
5. 判断してほしいこと、相談したいこと	例）メールマガジンを月1回に減らしてよいか

説明するときの一文 | 経営陣へ

「最初の3か月は、中期経営計画の『新規顧客からの売上』のうち、新規の商談をつくる部分をマーケティング部門の役割とし、商談化率を30%に戻すことをゴールにします。進み具合は定期的に報告し、ずれがあればその場で相談させてください。」

説明するときの一文 | メンバーへ

「この3か月で、部の目的とゴールを決め、仕事の進め方はみなさんと一緒に決めていきます。まずは、いま困っていることや、目的がわからない業務を教えてください。」

90日目の仕上がりチェック

8つすべてにチェックが入れば合格です。入らなかった項目は、次の3か月の最初に片づけます。

☐

ステップ1

ミッションが1〜2文で書かれ、経営陣が了承している

☐

ステップ5

ボトルネックがわかり、注力する課題が1〜2個に絞られている

☐

ステップ2

メンバー全員と1対1で話し、数字がどこまで取れているかわかっている

☐

ステップ6

やめる業務に了承を得て、クイックウインの結果が出ている

☐

ステップ3

3か月ゴール（数字の改善と仕組みの整備）を経営陣と合意している

☐

ステップ7

くり返す業務が「目的・担当・手順・完了の基準・期限」の1枚になっている

☐

ステップ4

誰が何を担うかが決まり、メンバーに伝わっている

☐

ステップ8

評価のルールと会議体が決まり、細かく指示しなくても回っている

合格ライン：8つすべてにチェック → 次は、役割を見直し、次の3か月のゴールを経営陣と合意する

さいごに

着任してすぐの時期は、目の前の依頼から動きたくなります。けれども、3か月後に「この3か月で何が変わったのか」にはっきり答えられるのは、何を指すかを先に経営陣と合意していた場合です。

まずは今日、経営計画を手元にそろえるところから始めてください。

ご質問・ご意見をお聞かせください

90日計画の立て方や、マーケティング部門の立ち上げについてのご相談も受けつけています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームへ →

mktg.ax/contact
